Nr.		Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer
1			PHASE I	8 Tage?
2			Bärg 5	2 Tage
3			Ltg Betrieb	2 Tage
4			Ass Ltg Betrieb -> Sockel -3	2 Tage
5			Garagengebäude	3 Tage
6			Controlling -> Sockel -3	3 Tage
7			Qualitätsmgmt -> Sockel -3	3 Tage
8			Med Inf I -> Sockel -3	3 Tage
9			Med Inf II -> Sockel -3	3 Tage
10			Seelsorge -> Sockel -3	3 Tage
11			Wald -2	2 Tage
12			Ltg GS | HD -> Sockel -1	2 Tage
13			Ltg Hotellerie -> Sockel -1	2 Tage
14			Ltg Bauprojekte -> Garagengebäude	2 Tage
15			Wald -1	2 Tage
16			Ass Hotellerie -> Sockel -1	2 Tage
17			Abschluss Phase I	
18				
19			PHASE II	35 Tage?
20			Bärg 5	3 Tage
21			Ltg Betrieb aufbereiten	2 Tage
22			Ltg Betrieb grundreinigen	1 Tag
23			Ass Ltg Betrieb aufbereiten	2 Tage
24			Ass Ltg Betrieb grundreinigen	1 Tag
25			Wald -2	6 Tage
26			Ltg GS | HD aufbereiten	3 Tage
27			Ltg GS | HD grundreinigen	1 Tag
28			Ltg Hotellerie aufbereiten	3 Tage
29			Ltg Hotellerie grundreinigen	1 Tag
30			Ltg Bauprojekte aufbereiten	3 Tage
31			Ltg Bauprojekte grundreinigen	1 Tag
32			Wald -1	3 Tage
33			Ass Hotellerie aufbereiten	2 Tage
34			Ass Hotellerie grundreinigen	1 Tag
35			Gargengebäude	10 Tage
36			Büros aufbereiten	5 Tage
37			Büros grundreinigen	5 Tage
38			Abschluss Phase II	0 Tage
39				
40			PHASE III	2 Tage?
41			Wald -1	2 Tage
42			Lungenberatung -> Wald -2	2 Tage
43			Diabetesberatung -> Wald -2	2 Tage
44			Ernährungsberatung -> Wald -2	2 Tage
45			OA Matter -> Sockel -1	2 Tage
46			Abschluss Phase III	0 Tage
47				
48			PHASE IV	3 Tage?
49			Wald -1	3 Tage
50			Lungenberatung aufbereiten	2 Tage
51			Lungeberatung grundreinigen	1 Tag

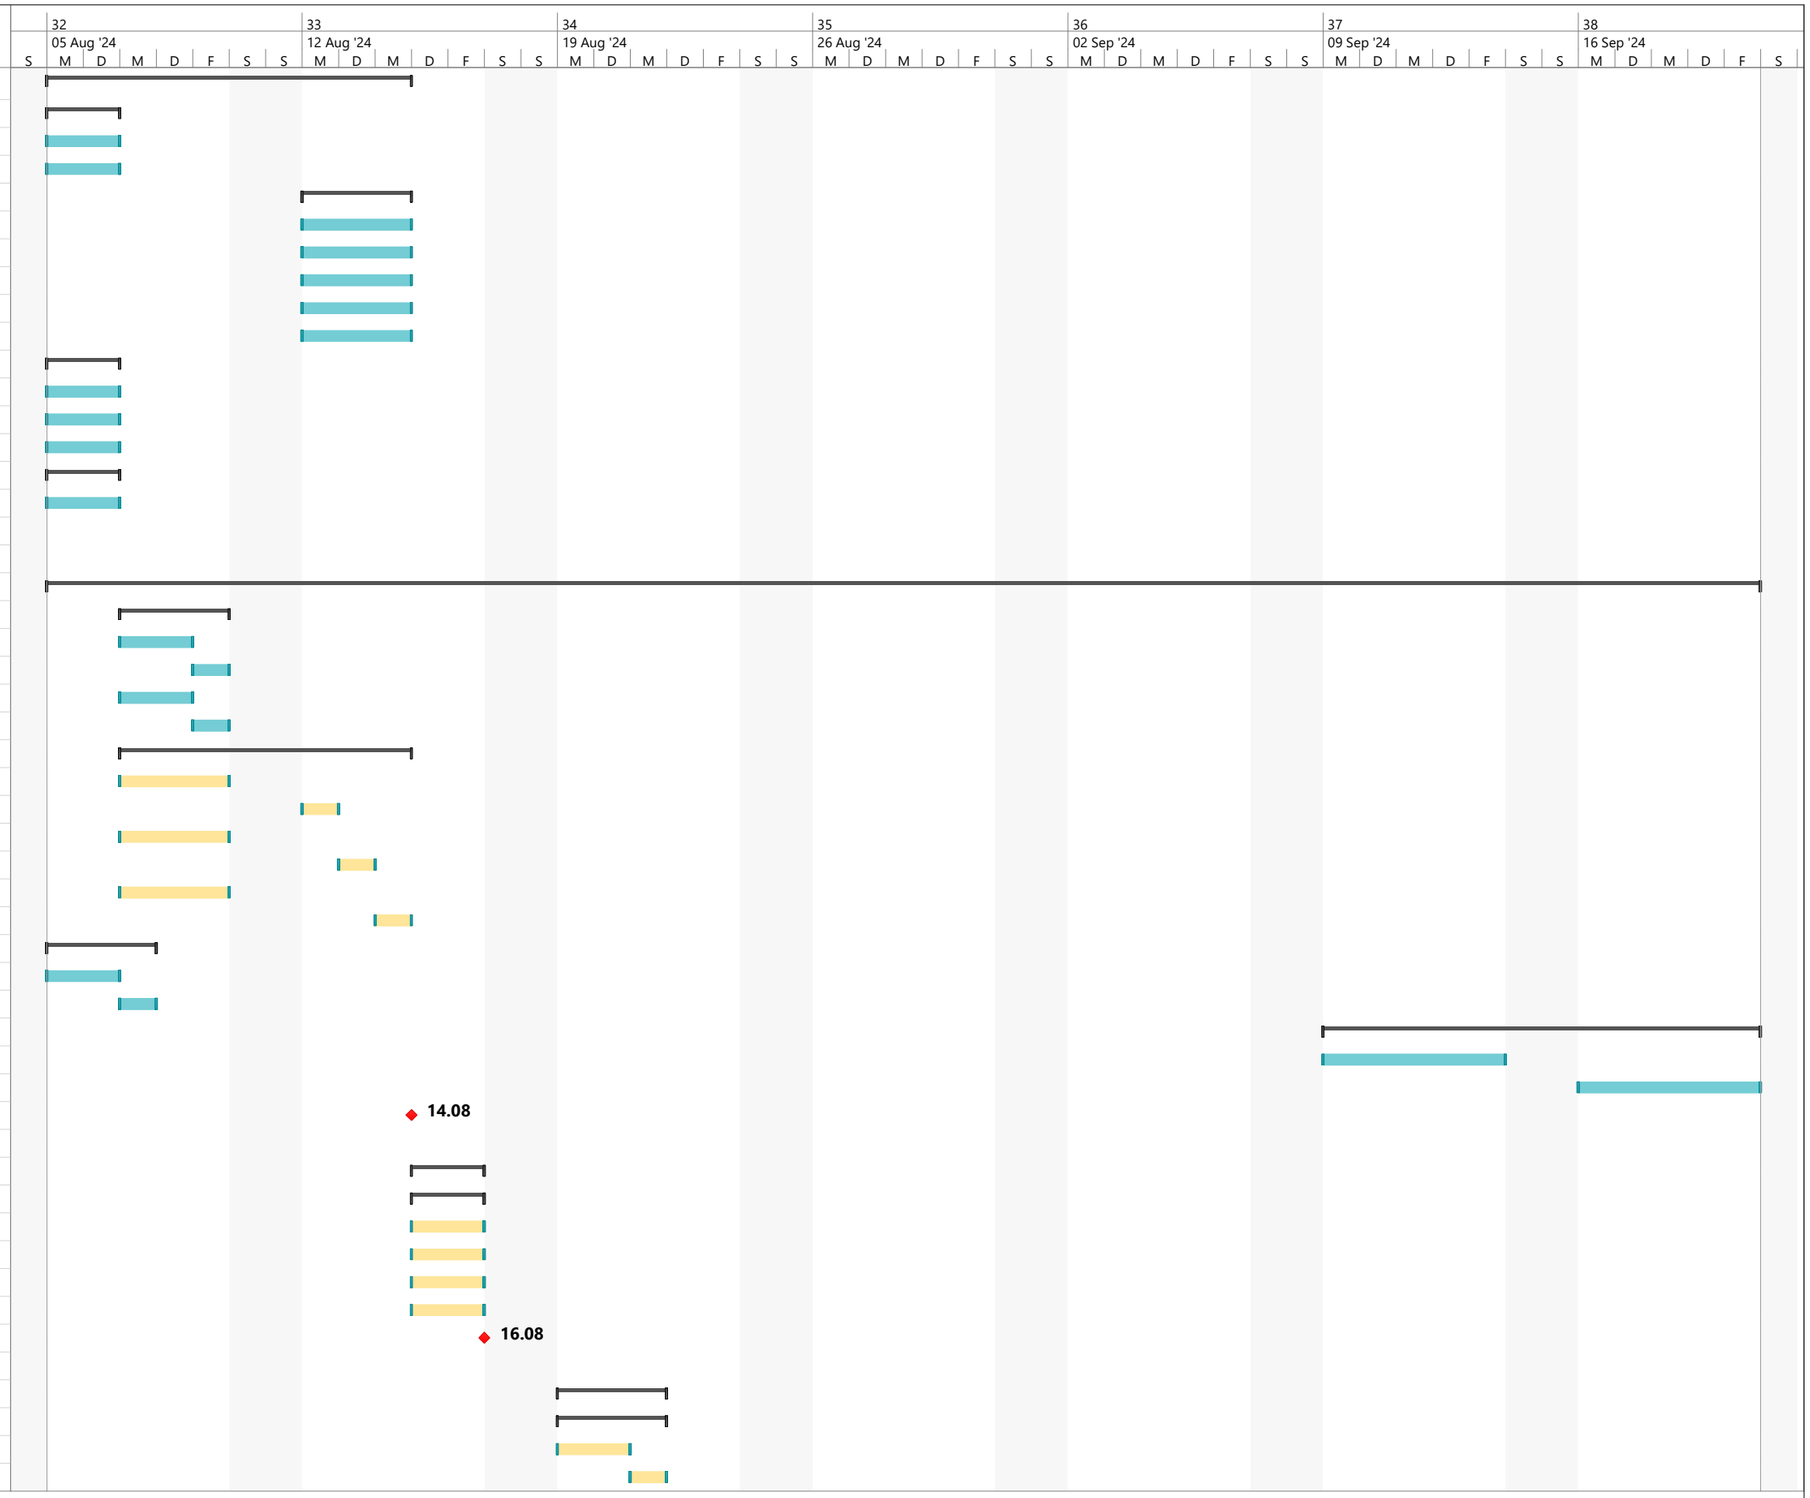

Projekt: Umzugsrochaden_V4
Datum: Mit 14.02.24

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Nr.	Vorgangsname	Dauer
52	Diabetesberatung aufbereiten	2 Tage
53	Diabetesberatung grundreinigen	1 Tag
54	Ernährungsberatung aufbereiten	2 Tage
55	Ernährungsberatung grundreinigen	1 Tag
56	OA Matter aufbereiten	2 Tage
57	OA Matter grundreinigen	1 Tag
58	**Abschluss Phase IV**	**0 Tage**
59		
60	PHASE V	**2 Tage?**
61	**Bärg 5**	**2 Tage**
62	PDL -> Wald -1	2 Tage
63	Ass PDL -> Wald -1	2 Tage
64	Stab PDL -> Wald -1	2 Tage
65	Bildungsv. Pflege -> Wald -1	2 Tage
66	**Abschluss Phase V**	**0 Tage**
67		
68	PHASE VI	**4 Tage?**
69	**Bärg 5**	**4 Tage**
70	Büros Leitung Pflege aufbereiten	2 Tage
71	Büros Ltg. Pflege grundreinigen	2 Tage
72	Büro PDL: Durchbruch Ostseite	3 Tage
73	**Abschluss Phase VI**	**0 Tage**
74		
75	PHASE VII	**27 Tage**
76	**Bärg EG**	**27 Tage**
77	Therapien Team / Ltg -> Sockel -2	15 Tage
78	Patientenadministration -> Bärg 5	10 Tage
79	Bettendisposition -> Bärg 5	2 Tage
80	Leitung Bauprojekte -> Bärg 5	2 Tage
81	**Abschluss Phase VII**	**0 Tage**
82		
83	Phase VIII	**2 Tage**
84	**Bärg 3**	**2 Tage**
85	Kaderärzte Bärg 3 -> Sockel -1	2 Tage
86	**Bärg -1**	**2 Tage**
87	Kaderärzte Bärg -1 -> Sockel -1	2 Tage
88	**Abschluss Phase VIII**	**0 Tage**
89		
90	Phase IX	**1 Tag**
91	**Bärg 3**	**1 Tag**
92	Erker reinigen	1 Tag
93	**Bärg -1**	**1 Tag**
94	Kaderarztbüros reinigen	1 Tag
95	**Abschluss Phase IX**	**0 Tage**
96		
97	Phase X	**2 Tage**
98	**Bärg 3**	**2 Tage**
99	Rückbezug Erker durch Physio	2 Tage
100	**Bärg -1**	**2 Tage**
101	Wiederherstellen Personalarzt-Büro	2 Tage
102	**Abschluss Phase X**	**0 Tage**

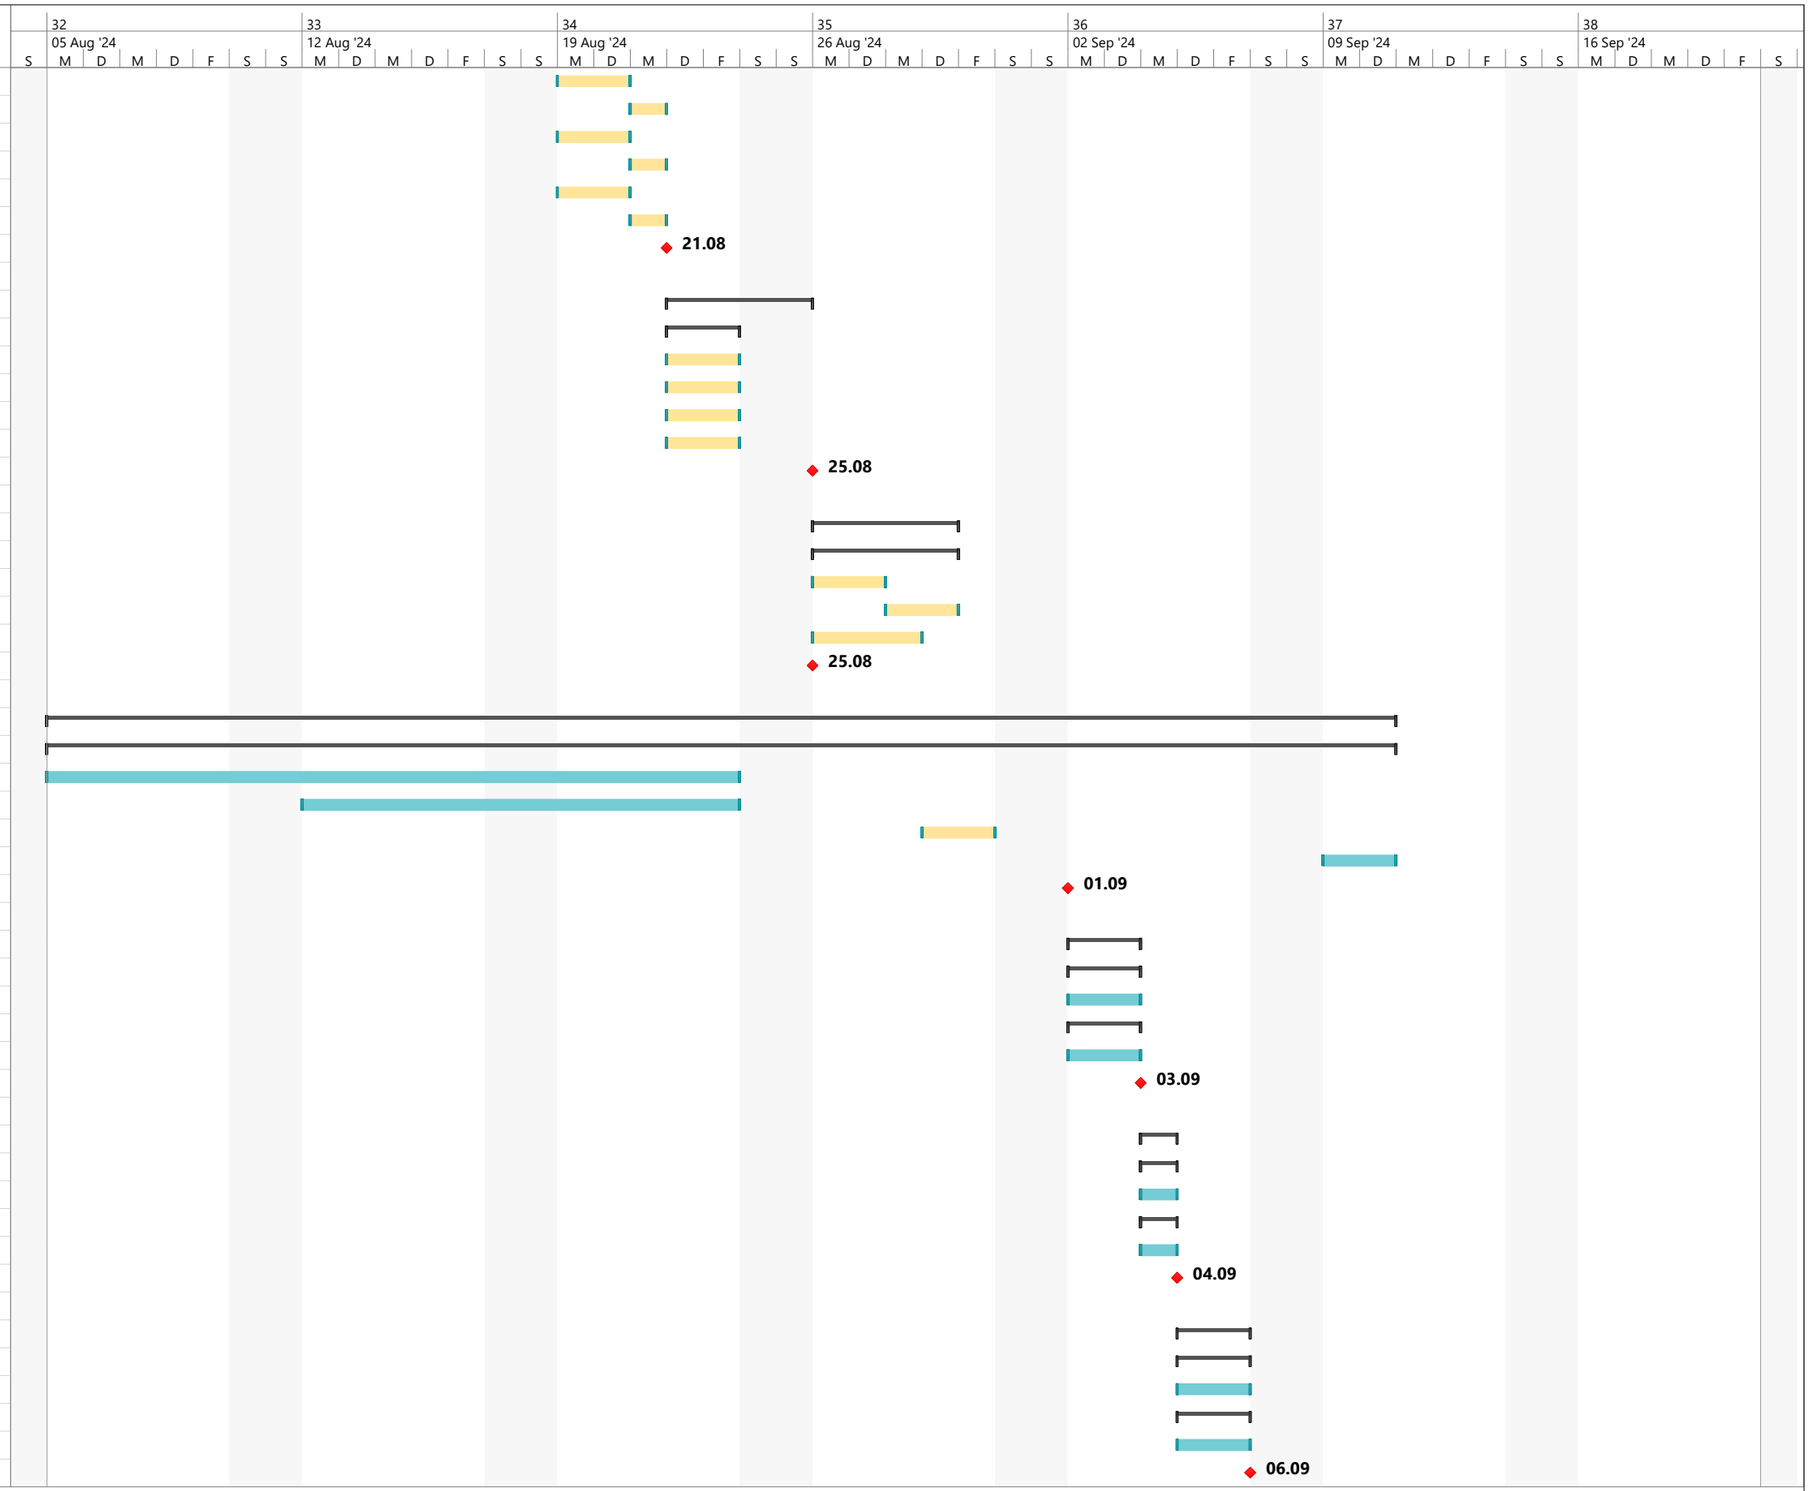

Projekt: Umzugsrochaden_V4
Datum: Mit 14.02.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
